

Возможности по сокращению сроков реализации бюджетных инфраструктурных проектов, выполняемых в рамках национальных проектов

С.П.Мямин,
первый заместитель генерального
директора АО «Форум-групп»

Цель: сократить на год срок реализации строительных проектов – от замысла до реализации


Задачи:

- **сократить срок реализации инвестиционных строительных проектов, реализуемых бюджетом (от замысла до ввода);**
- **создать условия для более быстрого освоения бюджетных средств;**
- **уменьшить риски неосвоения выделенных бюджетных средств**


В случае успеха субъект сможет претендовать на большую поддержку со стороны РФ и увереннее развиваться


- долго от замысла объекта начинаем строительство;
- необходимо пройти последовательно два административных барьера - все бюджетные процедуры как на уровне области, так и на уровне муниципалитета;
- поздно внутри года начинаем осваивать бюджетные средства

КАК СЕЙЧАС

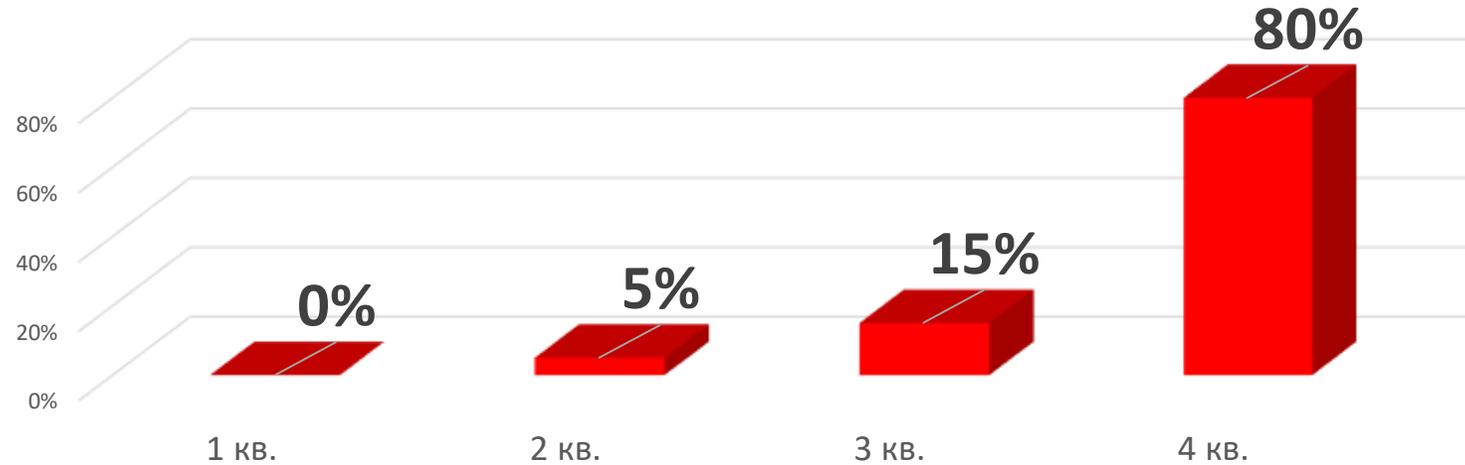

КАК НЕОБХОДИМО

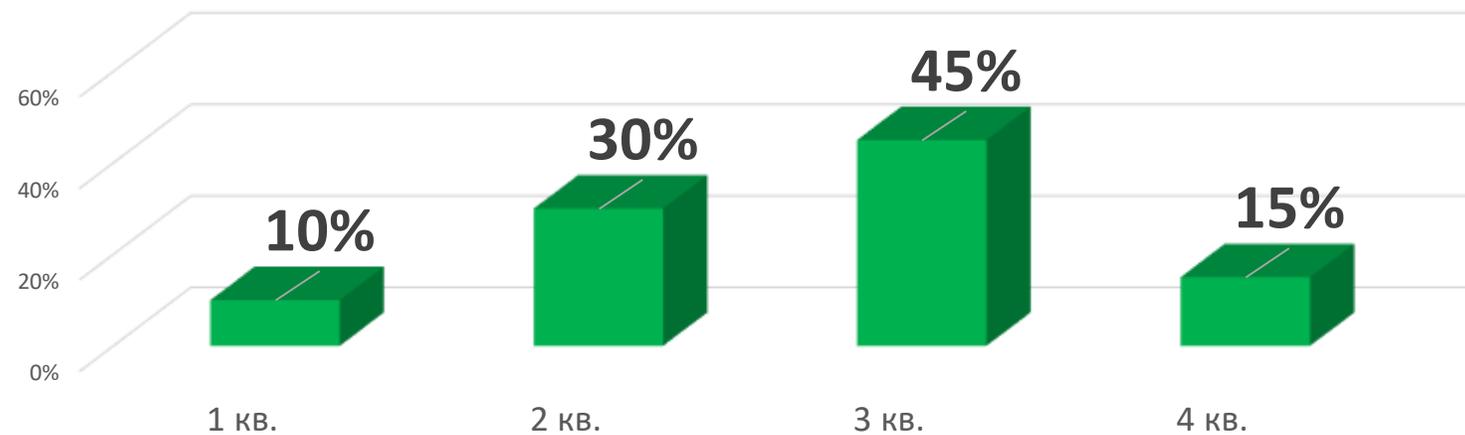

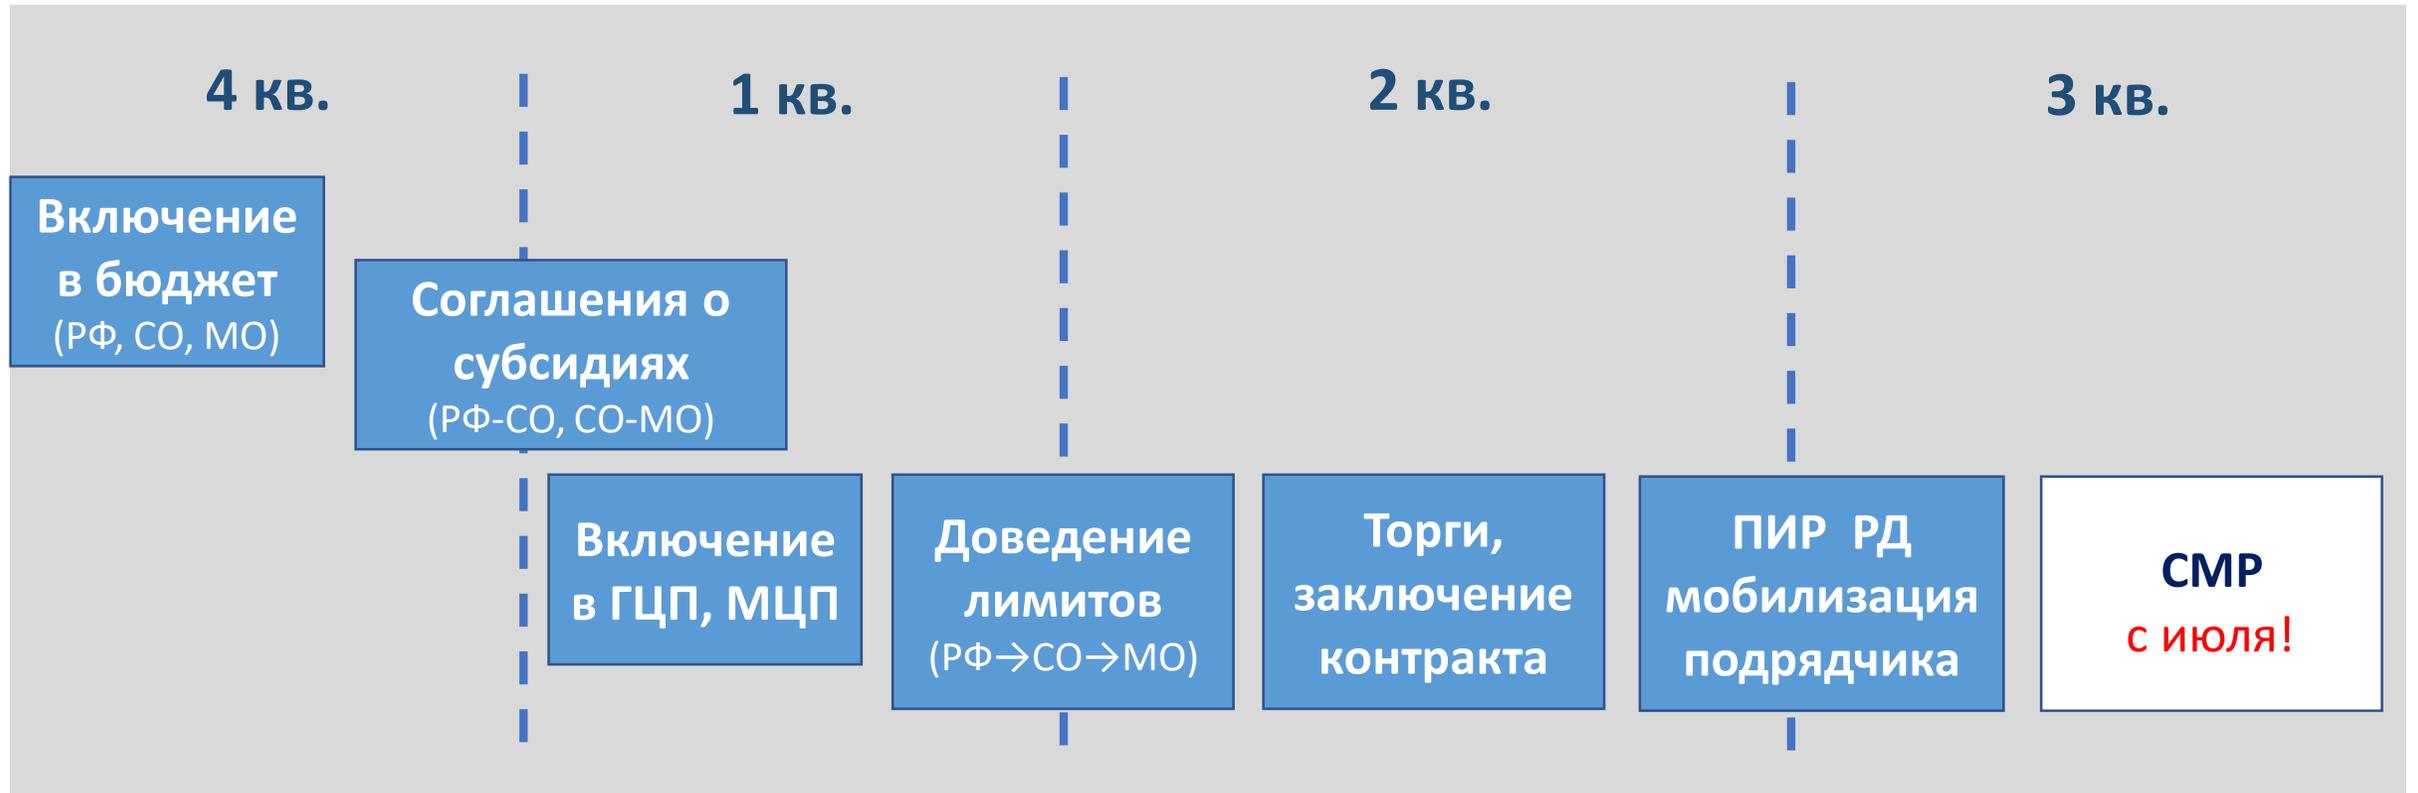

Сроки реализации бюджетных объектов




7-12 месяцев



9 месяцев



8-12 месяцев



1-2 года

- **изменить принцип планирования и доведения финансирования на глубину 3 года;**
- **включать объекты в бюджет, ГЦП/МЦП на основе ЭП/ТЭО;**
- **оценку экономической эффективности проводить на стадии ЭП;**
- **разработать мероприятия по исключению избыточных звеньев;**
- **внедрить принцип однократного согласования;**
- **создать правительственную комиссию по опыту федеральных;**
- **передать полномочия по оперативному перераспределению бюджетных средств профильным министерствам и ГРБСам;**
- **не занижать цену на стадии проектирования и гос.экспертизы**

Создать экспертные группы:

- Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области – под руководством Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта;
- Министерству экономики и территориального развития Свердловской области – под руководством Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова;

В рамках экспертных групп **подготовить предложения** по оптимизации сроков реализации бюджетных инвест.проектов

**При согласованной командной работе
есть потенциал существенного сокращения
сроков реализации бюджетных
инфраструктурных проектов**
